

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓**

โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก ๒ พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- โครงการชลประทานชลบุรี

งบประมาณ

- จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าควบคุมงาน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

กำหนดการเบิกจ่าย

จำนวน ๖ งวดงาน ดังนี้

- งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๙๖,๑๔๔ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๐.๕๒% วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓
- งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕,๓๗๘,๘๗๒ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๑๔.๒๖% วันที่ ๘ ก.ค. ๖๓
- งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๙,๒๘๖,๖๖๔ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๒๔.๖๒% วันที่ ๗ ส.ค. ๖๓
- งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๐,๑๐๑,๔๑๖ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๒๖.๗๘% วันที่ ๗ ก.ย. ๖๓
- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๓,๒๓๐,๐๘๔ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๒๔.๔๗% วันที่ ๘ ต.ค. ๖๓
- งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๓,๕๒๖,๘๒๐ บาท เมื่อแล้วเสร็จ ๙.๓๕% วันที่ ๗ พ.ย. ๖๓

วิธีการดำเนินการ

- ก่อสร้างชุดสระน้ำพื้นที่ประมาณ ๕๕ ไร่ ลึก ๔ เมตร ความจุเก็บกัก ๓๔๙,๐๐๐ ลบ.ม. และอาคารบังคับน้ำ อาคารระบายน้ำล้น ๑ แห่ง เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ๑ แห่ง ตามแบบที่แนบมา

ระยะเวลาดำเนินการ

- จำนวน ๑๘๐ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๓

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

- ในการดำเนินการชุดสระ ฝนตกทำให้บริเวณพื้นที่จะถูกกัดเซาะ เนื่องจากพื้นที่เป็นทราย

ผลการสอดส่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการประเมินความเสี่ยง

๑) มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๒ ราย คือ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด และบริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด และผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เสนอราคา ๓๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางที่เหมาะสม และมีการแต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอื่นๆ เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓) ดำเนินการแผนปฏิบัติแล้วเสร็จประมาณ ๑๓% ยังไม่มีการส่งงวดงาน


๔) การดำเนินงานอาจจะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประกอบกับมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการกักกันตัวและห้ามเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถนำของที่ต้องใช้ในการดำเนินงานมาที่โครงการได้

ข้อสังเกต

- เนื่องจากฤดูฝนกำลังใกล้เข้ามา พื้นที่ดำเนินงานเป็นทรายจะถูกกัดเซาะ ให้เร่งรีบดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้นำและผู้มีส่วนร่วม เข้ามามีส่วนร่วมในการนำหน้าดินมาถมบริเวณแปลงที่ดินดังกล่าวตามแผนปฏิบัติการ

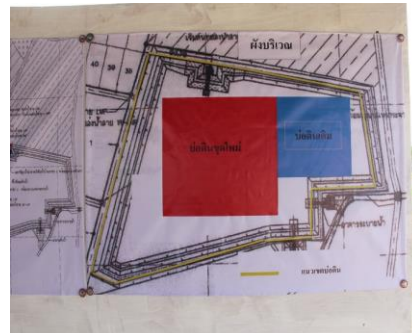

บันทึกข้อความ

am ✓

(นางอัญชลี คำชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลการเสนอราคาตามใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (๔๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐) - (๓๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๘ ของวงเงินงบประมาณ และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๐,๔๗๓,๗๗๔.๒๒ บาท (๔๘,๑๔๓,๗๗๔.๒๒) - (๓๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๓ ของราคากลาง และคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๖ ของผลประกวดราคา กำหนดระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานจากกรม และกำหนดยื่นราคา ๒๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคาครบกำหนดยื่นราคาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ฉ) การอนุมัติรับราคา เป็นอำนาจของ ผศป.ชลบุรี ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๓๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรับราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภูษิต พรหมเมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนา อุทาพิทย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยรุณ ปิยะวโร)

ผ่าน / ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตลอดจนการปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ เห็นควรอนุมัติรับราคาเป็นเงิน ๓๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากบริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ EB ขบ.-จ.๐๕/๒๕๖๓

อนุมัติ

(นายทินกร สุทิน)

ผศป.ชลบุรี

am ✓

(นางอัญชลี คำชื่น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก ๒ พร้อมระบบ
แพร่กระจายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก ๒
พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB ขบ.-จ.๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

กิจกรรมอาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก ๒ พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น
สิ้น ๓๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทินกร สุทิน)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรีตรวจสอบการดำเนินงาน
อาคารบังคับน้ำบ้านเขาชก 2 พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ

